



Aan: Gemeente Vijfheerenlanden
T.a.v. de leden van de Gemeenteraad
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Ons kenmerk : 195326

Onderwerp : Update aanleg
glasvezelnetwerk

Datum : 08 februari 2021

Geachte leden van de raad,

In de gemeente Vijfheerenlanden (VHL) is in april 2020 gestart met de realisatie van glasvezel in zowel de kernen (uitgezonderd Vianen en Leerdam) als het buitengebied en op de bedrijventerreinen. De werkzaamheden worden door firma Netwerk Services B.V. (NKM), namens Deltafiber Netwerk (DFN, voorheen Glasvezel Buitenaf) uitgevoerd. NKM besteedt op zijn beurt de werkzaamheden uit aan onderaannemer Euronet Infratechniek B.V. (EI). De totale tracélengte van het glasvezelnetwerk welke door EI wordt gerealiseerd is ongeveer 240 km.

In deze brief komen de voortgang van de werkzaamheden, situationeel bodemonderzoek en de schades aan de infrastructuur binnen de gemeente Vijfheerenlanden aan de orde.

VOORTGANG REALISATIE AANLEG GLASVEZELNETWERK

De verwachting is dat de werkzaamheden medio maart 2021 in het buitengebied grotendeels gereed zijn en voor de kernen eind januari 2021. Voor de bedrijventerreinen is gestart met de vraagbundeling, behalve op het terrein in Meerkerk. Daar ligt al een glasvezelnetwerk van Case Electronics, dat is aangelegd in 2015, mede op initiatief van de ondernemersvereniging. Dat netwerk biedt alle ondernemers de mogelijkheid daarop aan te sluiten. Deltafiber Netwerk heeft hierop de aandacht gevestigd en gevraagd of op dit terrein hun verplichting op grond van de samenwerkingsovereenkomst achterwege kan blijven. Met de huidige aanbieder is dit besproken en hij heeft aangeboden de ondernemers die nog niet zijn aangesloten nog een keer actief te benaderen. Ook is hij bereid na te gaan of er mogelijkheden zijn het abonnementstarief te verlagen. Hoewel niet via de contractpartner blijft het doel om alle bedrijventerreinen, dus ook Meerkerk, via glasvezel te ontsluiten, in stand.

Tijdens de werkzaamheden hebben diverse bewoners alsnog aangegeven te willen aansluiten op het glasvezelnetwerk. Afspraken met deze bewoners worden na de realisatie ingepland. Deze aansluitingen worden nog geïnventariseerd door NKM. NKM verwacht medio januari 2021 een overzichtslijst te hebben van al deze nagekomen aansluitingen.

Op de Diefdijk, Zouwendijk en Lekdijk loopt de aanleg vertraging op. De aanleg passeert private gronden, waarvoor Deltafiber Netwerk gedoogverklaringen moet bemachtigen. Nog niet alle grondeigenaren hebben de gedoogverklaringen afgegeven.

Per kern is de stand van zaken als volgt:

Schoonrewoerd

- Kerngebied is opgeleverd;
- Buitengebied is opgeleverd, Diefdijk uitgezonderd;
- Enkel nog restpunten herstellen n.a.v. oplevering.

Zijderveld

- Kern- en buitengebied zijn opgeleverd;
- Enkel nog restpunten herstellen n.a.v. oplevering.

Everdingen

- Kern- en buitengebied zijn opgeleverd;
- Enkel nog restpunten herstellen n.a.v. oplevering.

Hagestein

- Op een enkele opleverpunten is het kerngebied gereed;
- Buitengebied is eveneens bijna gereed. De boorgaten van de boorploegen moeten enkel nog worden nagekeken.
- Oplevering kerngebied volgt z.s.m.

Leerbroek

- Civieltechnische werkzaamheden zijn in het kerngebied gereed;
- In het buitengebied worden de glasvezelkabels nog gelast;
- Verder moeten er nog huisaansluitingen worden gemaakt en het kern- en buitengebied;
- Oplevering kerngebied volgt z.s.m.

Kedichem

- Civieltechnische werkzaamheden in het kern- en buitengebied zijn gereed;
- Oplevering kerngebied volgt z.s.m.

Nieuwland

- Alle werkzaamheden zijn in het kern- en buitengebied op een paar punten na gereed;
- Kunstwerk moet nog onder water worden geplaatst;
- Planning is eind januari 2021 gereed.

Lexmond

- In Lexmond worden geen werkzaamheden binnen het kerngebied uitgevoerd;
- Inmiddels is gestart met civieltechnische werkzaamheden in het buitengebied.

Hei- en Boeicop

- Civieltechnische werkzaamheden zijn in uitvoering in het kern- en buitengebied;
- Hei- en Boeicopseweg is een lastig tracé met veel uitdagingen waardoor afgeweken moest worden van het gebruikelijke proces. Met de toepassing van andere technieken, waaronder boren, zijn de meeste problemen inmiddels overwonnen;
- Het buitengebied is grotendeels gereed.


Ameide

- Werkzaamheden kern- en buitengebied moeten nog worden ingepland;
- Op dinsdag 22 september 2020 is overleg geweest tussen Vijfheerenlanden en NKM over de kabeltracés in Ameide en realisatie aanvoer kabel tracé naar Sluis. Alternatieven zijn aan NKM voorgesteld door Vijfheerenlanden. NKM gaat in overleg met DFN. Wachten op een akkoord en projectvoorstel t.b.v. het realiseren van de werkzaamheden van DFN.



Meerkerk

- Civieltechnische werkzaamheden zijn in uitvoering in het kern- en buitengebied;
- Bazeldijk is een lastig tracé. Er is op 22 september 2020 overleg geweest tussen VHL en NKM. Alternatieven zijn voorgesteld door VHL. NKM gaat in overleg met DFN. Wachten op een akkoord en projectvoorstel t.b.v. het realiseren van de werkzaamheden van DFN.

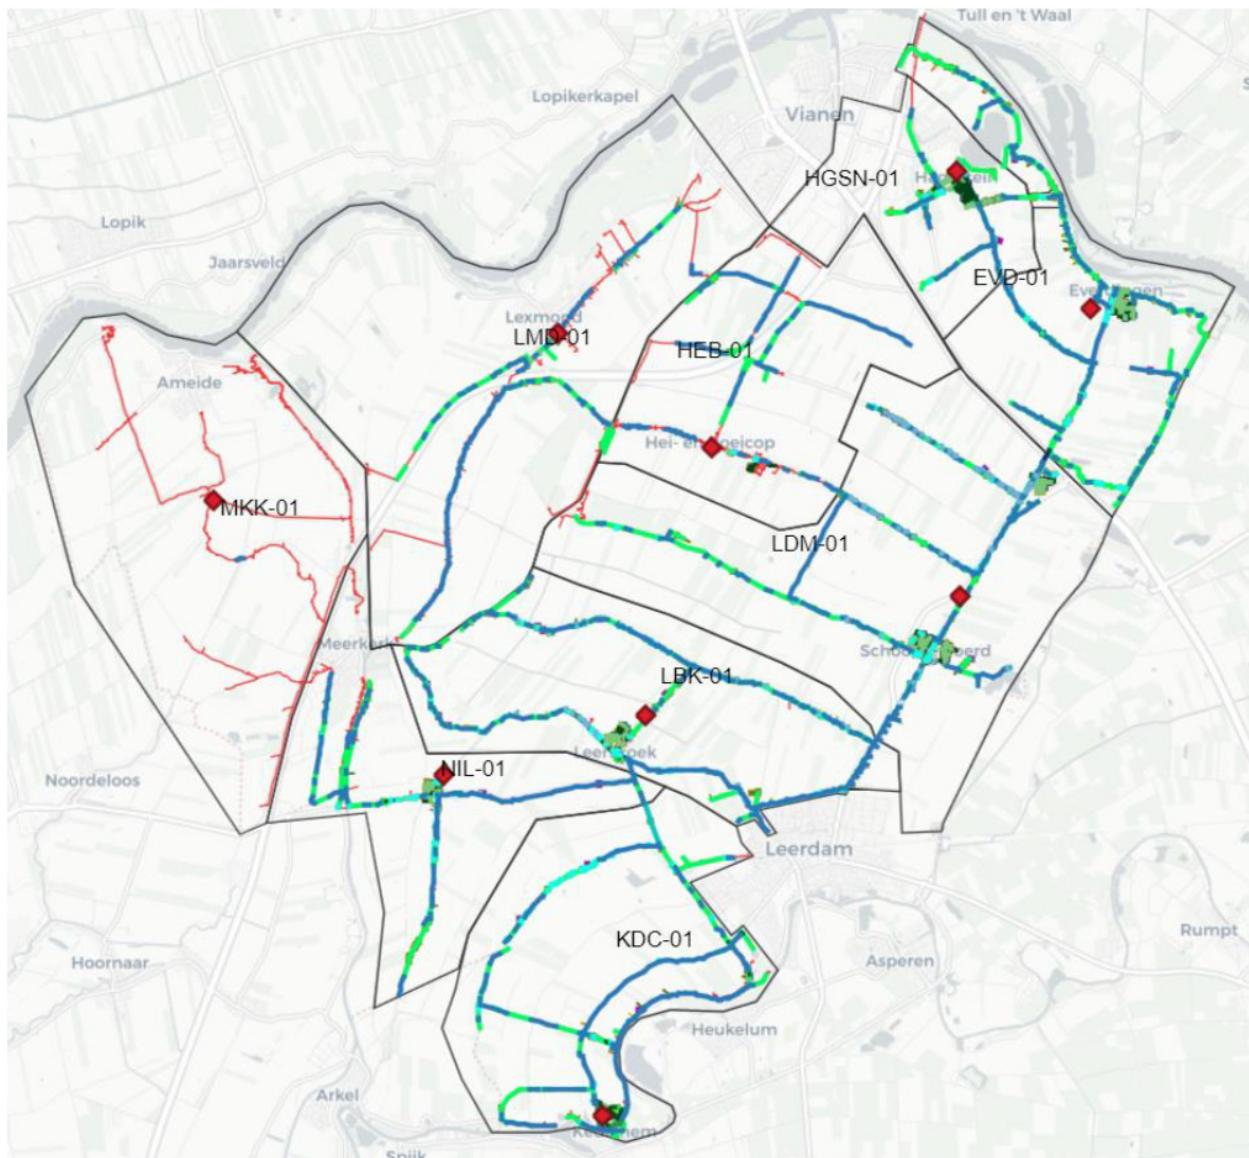

Figuur 1: Overzichtskartaal realisatie glasvezel

Legenda:

	Gereed
	Gereed
	Gereed
	PoP
	In uitvoering/ontwikkeling



SITUATIONEEL BODEMONDERZOEK

NKM heeft tijdens de werkzaamheden op een aantal locaties een vermoeden van bodemverontreiniging geconstateerd. Daar is bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er op verschillende locaties vervuiling is aangetroffen. In de onderstaande tabel staan de locaties aangegeven.

Om toch de vervuilde locaties te voorzien van glasvezel, is er in overleg met de gemeente overgegaan tot boringen. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente of de bewoners en bedrijven.

Tabel 1: Vervuilde tracés

Trace	Lengte	Status
Dorpsstraat 55a, Schoonrewoerd	21,50 m	Tracé is geboord
Dorpsweg 3-8, Zijderveld	121,50 m	Tracé is geboord
Leerbroekseweg 48, Leerbroek	46 m	Tracé is geboord
Kern van Leerbroek	13,80 m	Tracé is geboord
Kerkweg 18, Zijderveld	28,30 m	Tracé is geboord
Breezijde 5, Nieuwland	113,90 m	Tracé is geboord
Tienhovenseweg 9-17, Tienhoven	139,30 m	Tracé is geboord
Broekseweg, Ameide	68,30 m	Tracé is geboord
Broekseweg Ameide	96,40 m	Tracé is geboord
Hei- en Boeicopseweg 168, Hei- en Boeicop	30 m	Tracé is geboord
Hei- en Boeicopseweg 156, Hei- en Boeicop	58 m	Tracé is geboord
Hei- en Boeicopseweg 121 en 123, Hei- en Boeicop	7 m	Tracé is geboord
Hei- en Boeicopseweg 90, Hei- en Boeicop	17,20 m	Tracé is geboord

SCHADES DOOR AANLEG GLASVEZELNETWERK

Tijdens de realisatie van het glasvezelnetwerk zijn er schades ontstaan aan riolering en bomen. Omwonenden hebben van de rioolschades weinig overlast gehad. Dit kwam voornamelijk door het snelle reageren en oplossingsvermogen van de onderhoudsmonteurs en rioolbeheerders van Vijfheerenlanden.

Vijfheerenlanden heeft in overleg met NKM het aantal graafploegen in de gemeentelijke kernen teruggebracht naar maximaal drie ploegen per kern, om schades zoveel mogelijk te voorkomen. Ook vinden er gesprekken plaats tussen het Agentschap Telecom, NKM, Vijfheerenlanden en andere nutsbedrijven die schades ondervinden. Tijdens deze gesprekken worden de schades behandeld en oplossingen bedacht om schades in de toekomst zoveel als mogelijk te minimaliseren. Schades kunnen niet altijd worden voorkomen. NKM maakt gebruik van zgn. KLIC-meldingen. Die meldingen geven inzicht in



de ligging van ondergrondse kabels en leidingen, zoals destijds bij de aanleg daarvan vastgesteld.

Er zijn op dit moment 23 gevallen van schade aan rioleringen. Ook zijn 22 bomen beschadigd. Van de rioolschades zijn er vier inmiddels betaald door de onderaannemer van NKM. Er zijn er nog 19 in behandeling. Het schadebedrag voor het riool bedraagt € 60.367,62 waarvan € 9.240,59 is betaald.

Voor de schades aan bomen zijn voor 16 bomen onderzoeken door een externe bomendeskundige uitgevoerd. Deze kosten worden op de veroorzaker verhaald en zijn nog in behandeling. Het schadebedrag voor de bomen bedraagt voor zover bekend € 20.696, -. Verder is het van belang om te vermelden dat de resterende schades aan de bomen nog worden onderzocht en getaxeerd door een externe bomendeskundige.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

S. (Sjors) Fröhlich

